


① 正面図（道路側より見る）

S = NTS（形状・寸法・面数は現地実測による）

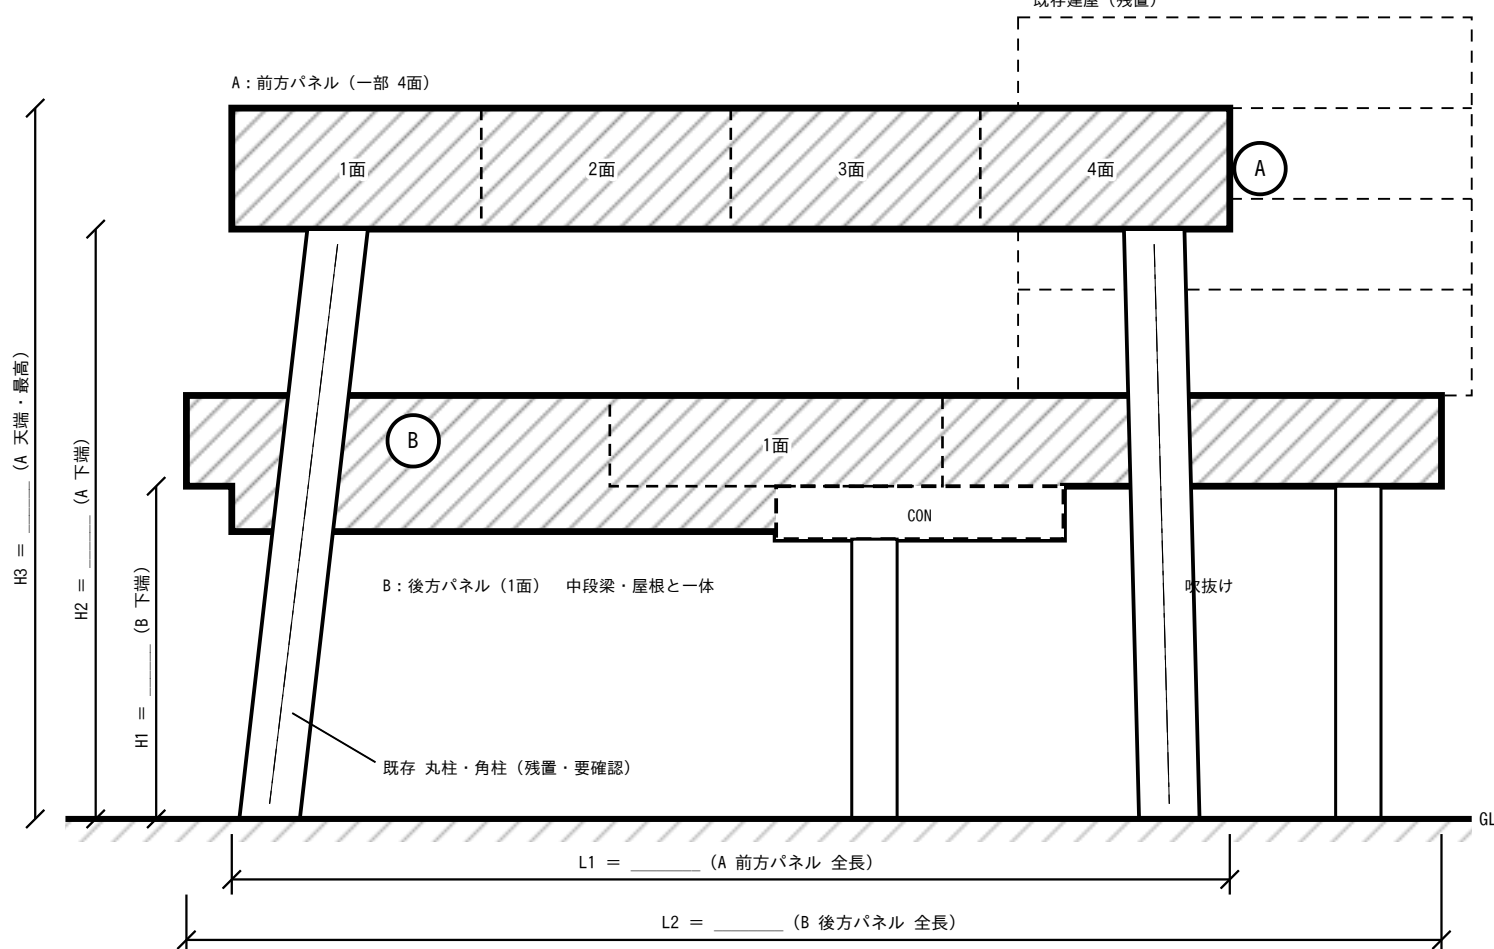

※ 面の区分・位置は現地確認のうえ本図に朱書きのこと。丸柱・角柱・既存建屋は残置。

③ 撤去範囲リスト

記号	撤去部位	仕様・材質（想定）	数量（実測記入）	備 考
A	前方パネル（一部 4面） サイン付き 上部梁 前面	鋼製サイン板・化粧パネル 板金巻き	4面 L = _____ m H = _____ m	サイン内 照明・配線を事前切離し 道路側：高所作業車にて施工
B	後方パネル（1面） 中段梁・屋根と一体	化粧パネル・板金 鋼製梁／ポリカ波板	1面 L = _____ m H = _____ m	敷地内：ローリングタワーで検討 直下の駐車車両 移動・養生
L	奥のルーバー + 下地 （②上空図 参照）	アルミ／鋼製 ルーバー 鋼製下地（母屋・アングル）	_____ × _____ = _____ m ²	下地共に撤去。切断・仮支持を検討 敷地内：ローリングタワーで検討
S	取合い部 シール （先行撤去）	変成シリコン等 （既存シーリング）	L = _____ m	本体撤去に先行して撤去 石綿含有の有無を事前調査
要確認	CON 部（RCスラブ）の撤去要否 丸柱・角柱の存置／撤去	RC スラブ・天井・照明 —	_____ m ² —	現地で確定し本図へ朱書き 吹抜け部は撤去なし

凡 例



撤去範囲（A・B・L）



撤去要否 要確認／面の区分



既存・残置部


注 記

- 本図は現地写真・手描きスケッチ・聞き取りに基づく略図。寸法・面数・範囲は現地実測により確定する。
- 撤去範囲＝ 前方パネル（一部 4面）／後方パネル（1面）／奥のルーバー＋下地。
- 取合い部のシールは本体撤去に先行して撤去する。石綿含有の有無を事前調査のこと。
- 高所作業は 道路側＝高所作業車、敷地内＝ローリングタワー（ローリング）で検討。道路使用許可・歩道養生の要否を確認。
- サイン内部の照明・電源配線、屋根下の照明・配線は事前に切離し。梁・下地の切断は順序と仮支持を検討。
- 営業中のため駐車車両の移動・養生、搬出経路の確保を事前調整。撤去材は分別・積込・搬出・処分。
- 記号と部位の対応・パネルの位置は現地で確認し、本図に朱書きのこと。

現調メモ（実測・所見）

② 上空図（上から見る）

S = NTS

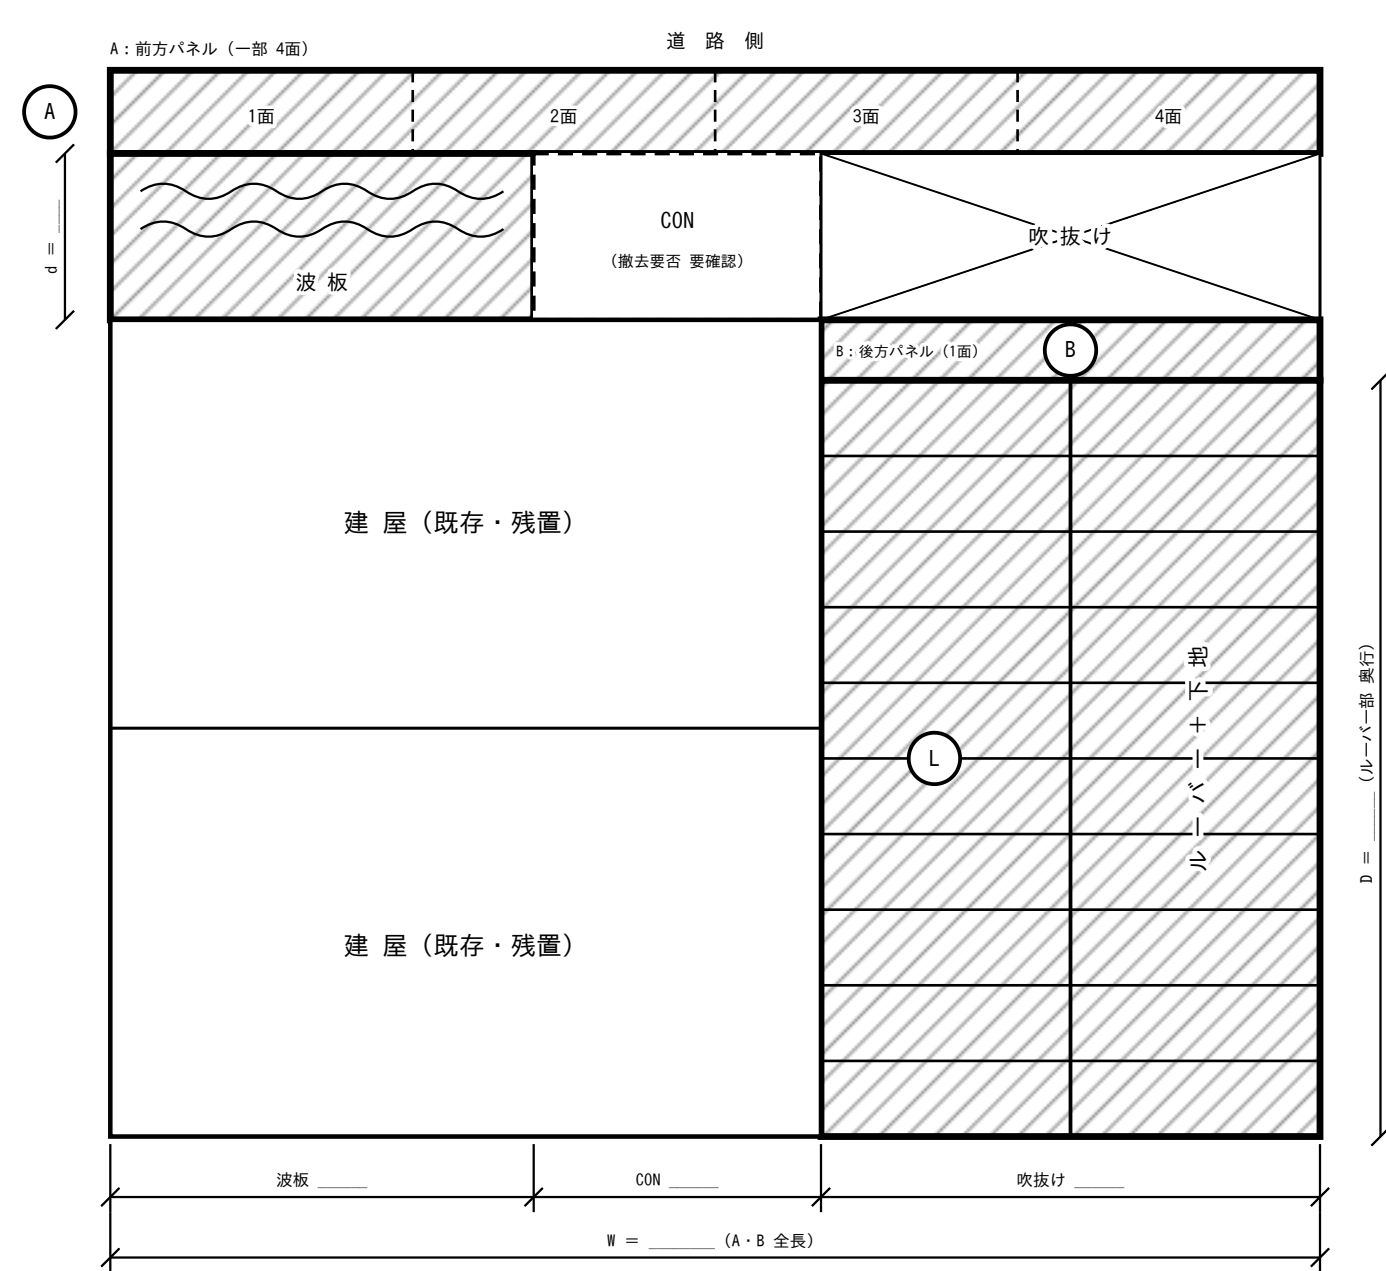

※ 手描きスケッチ（上から）をもとに作図。各部の寸法・区分・面数は現地実測により確定。

※ 吹抜け部は撤去なし。CON 部の撤去要否は現地でお客様と確認のこと。

※ ルーバーは下地（母屋・アングル）共に撤去。取合い部シールは先行撤去。

④ 工事概要・作業条件

現地調査	2026年 9月2日（水）9:00 現地調査
関係者	専務 藤井 様（熊谷組 担当）／社長 古谷 様／会長 園尾 様
撤去範囲	前方パネル 一部 4面 ／ 後方パネル 1面 ／ 奥のルーバー + 下地
先行作業	取合い部のシールは先行撤去（石綿含有の有無を事前調査）
施工方法	道路側：高所作業車 ／ 敷地内：ローリングタワー（ローリング）にて検討
留意事項	営業中：駐車車両の移動・養生／道路使用許可・歩道養生の要否／搬出経路の確保

数量 記入欄

前方パネル ____×____ ×4面

後方パネル ____×____ ×1面

ルーバー ____×____ = ____m²

下地 ____ m ／ シール ____ m

A 全長 ____ ／ B 全長 ____

撤 去 範 囲 図（現地調査用）

工事名	前方・後方パネル／ルーバー 撤去工事（仮称）
所在地	神奈川県横浜市中区築区茅ヶ崎南 3-23-5
建 物	信和ホームズ㈱ 社屋 車寄せ（写真サイン表記による）
現調 2026/09/02 9:00 作成 2026/09/01	縮尺 NTS ／ A3 ／ 図番 01（rev.3）
