


① 正面立面図（道路側より見る）


S = NTS（寸法は現地実測による）

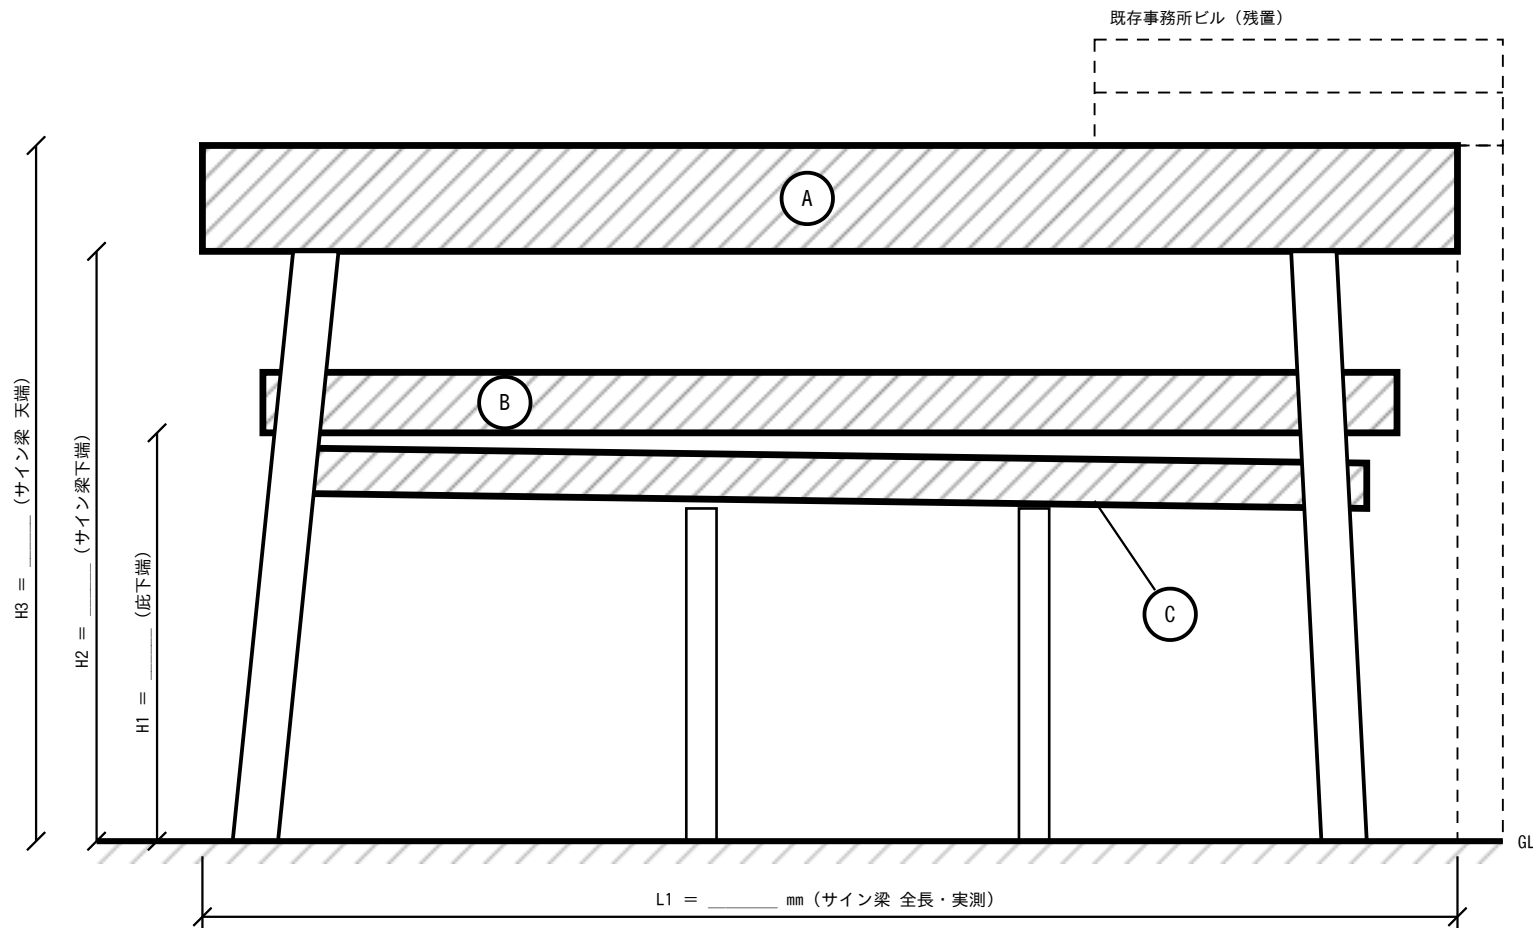

※ 柱（門型・後方）は残置。撤去はハッチング部（A・B・C）のみ。

② 側面図（奥行方向）


S = NTS

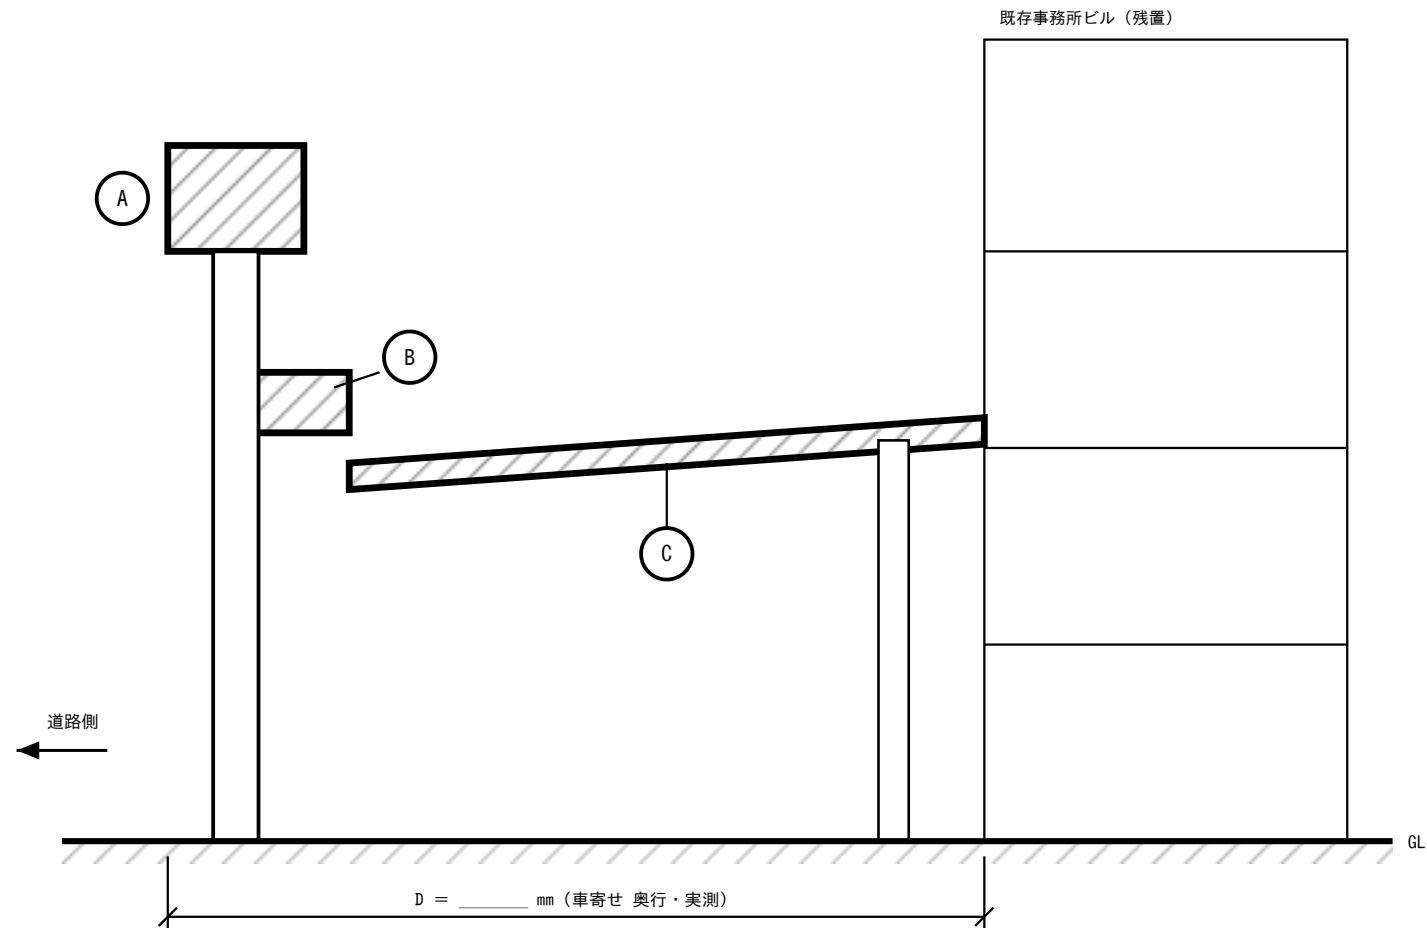

※ 屋根勾配・既存建物との取合い（雨仕舞い）は現地確認。

③ 車寄せ 屋根伏図（撤去範囲）

S = NTS

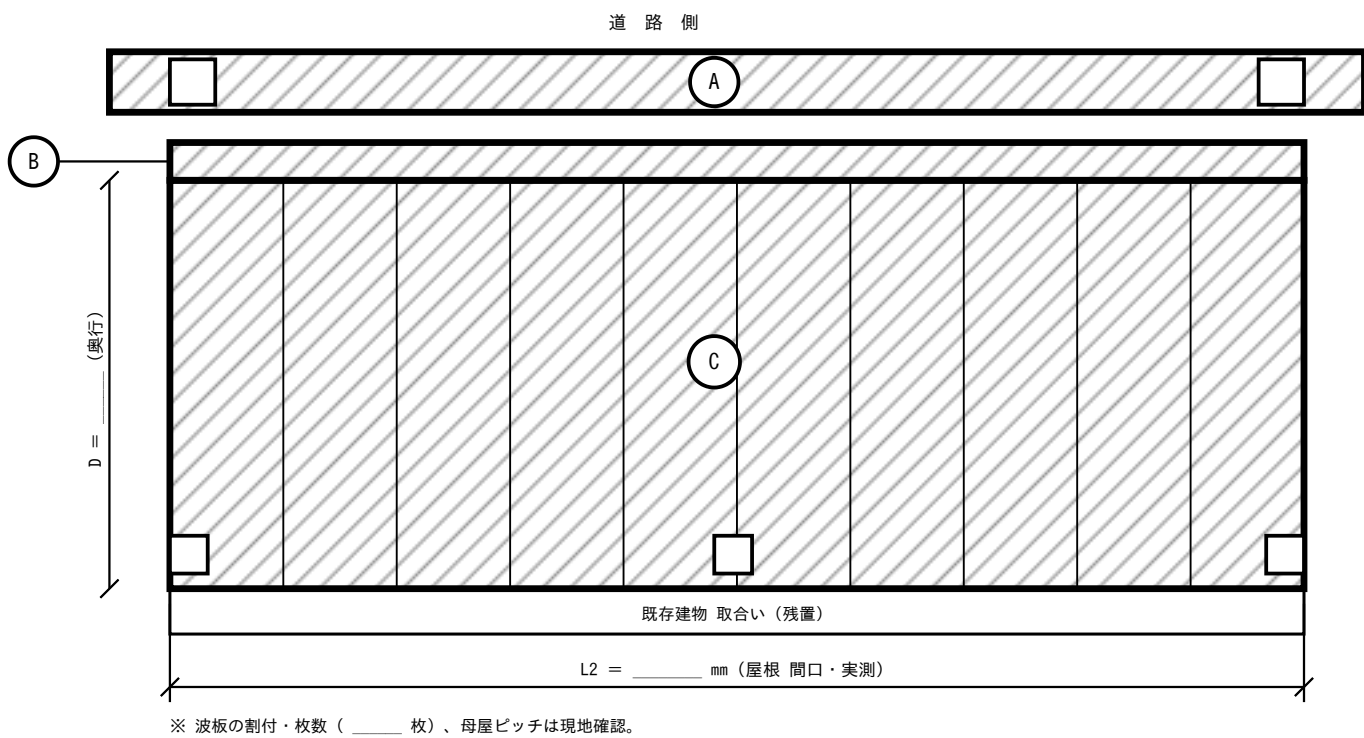

※ 波板の割付・枚数（ ____ 枚）、母屋ピッチは現地確認。

④ 撤去範囲リスト

記号	撤去部位	仕様・材質（想定）	数量（実測記入）	備 考
A	社名サイン付き 梁・看板部 （門型梁 上部・両端はね出し含む）	鋼製サイン＋既存梁 化粧板・板金巻き	L = ____ m H = ____ m	サイン内 照明・配線の有無確認 高所作業車 必要
B	中段庇 先端梁・見切り／ 化粧パネル（帯状部）	鋼製梁＋板金パネル （一部 錆・劣化あり）	L = ____ m （ ____ 箇所）	構造体か仕上げのみかを現地判断 残置部との切断位置を明示
C	車寄せ 採光屋根 （波板＋下地母屋・吊材）	ポリカ／塩ビ波板 鋼製母屋・アングル	____ m × ____ m = ____ m ² （ ____ 枚）	直下の駐車車両 移動・養生 雨仕舞い（撤去後の取合い）確認
共通	撤去材の分別・小運搬・積込 搬出・処分	金属くず／廃プラ 他	車両 ____ 台 人工 ____ 人	作業日・作業時間帯（営業中）の調整 搬出経路・駐車スペースの確保

凡 例



撤去範囲（A・B・C）

—— 既存・残置部

----- 後方・見え掛り／不明部

※ 太線＋斜線ハッチ = 撤去、細線 = 残置。切断位置は現地で墨出し・写真記録のこと。

現調メモ（実測・所見）

撤 去 範 囲 図（現地調査用）

工事名	車寄せ 採光屋根・サイン梁 撤去工事（仮称）		
所在地	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南 3-23-5		
建 物	信和ホームズ(株) 社屋 車寄せ（写真サイン表記による）		
現調日 2026/09/02（水）9:00		作成日 2026/09/01	
縮尺 NTS	用紙 A3	図番 01	

注 記

- 本図は現地写真をもとに作成した略図。形状・寸法は現地実測により確定する。
- 撤去範囲は写真のマーキング部（A：サイン梁／B：中段庇 先端・見切り／C：採光屋根）。
- サイン内部の照明・電源配線の有無を確認し、事前に切離しを行う。
- 高所作業（H≒6～7m 想定）。高所作業車または足場の設置計画、道路使用・歩道養生の要否を確認。
- 石綿含有建材（成形板・シーリング等）の事前調査結果を確認のうえ着手すること。
